


།།།།།

社会

།།།།།

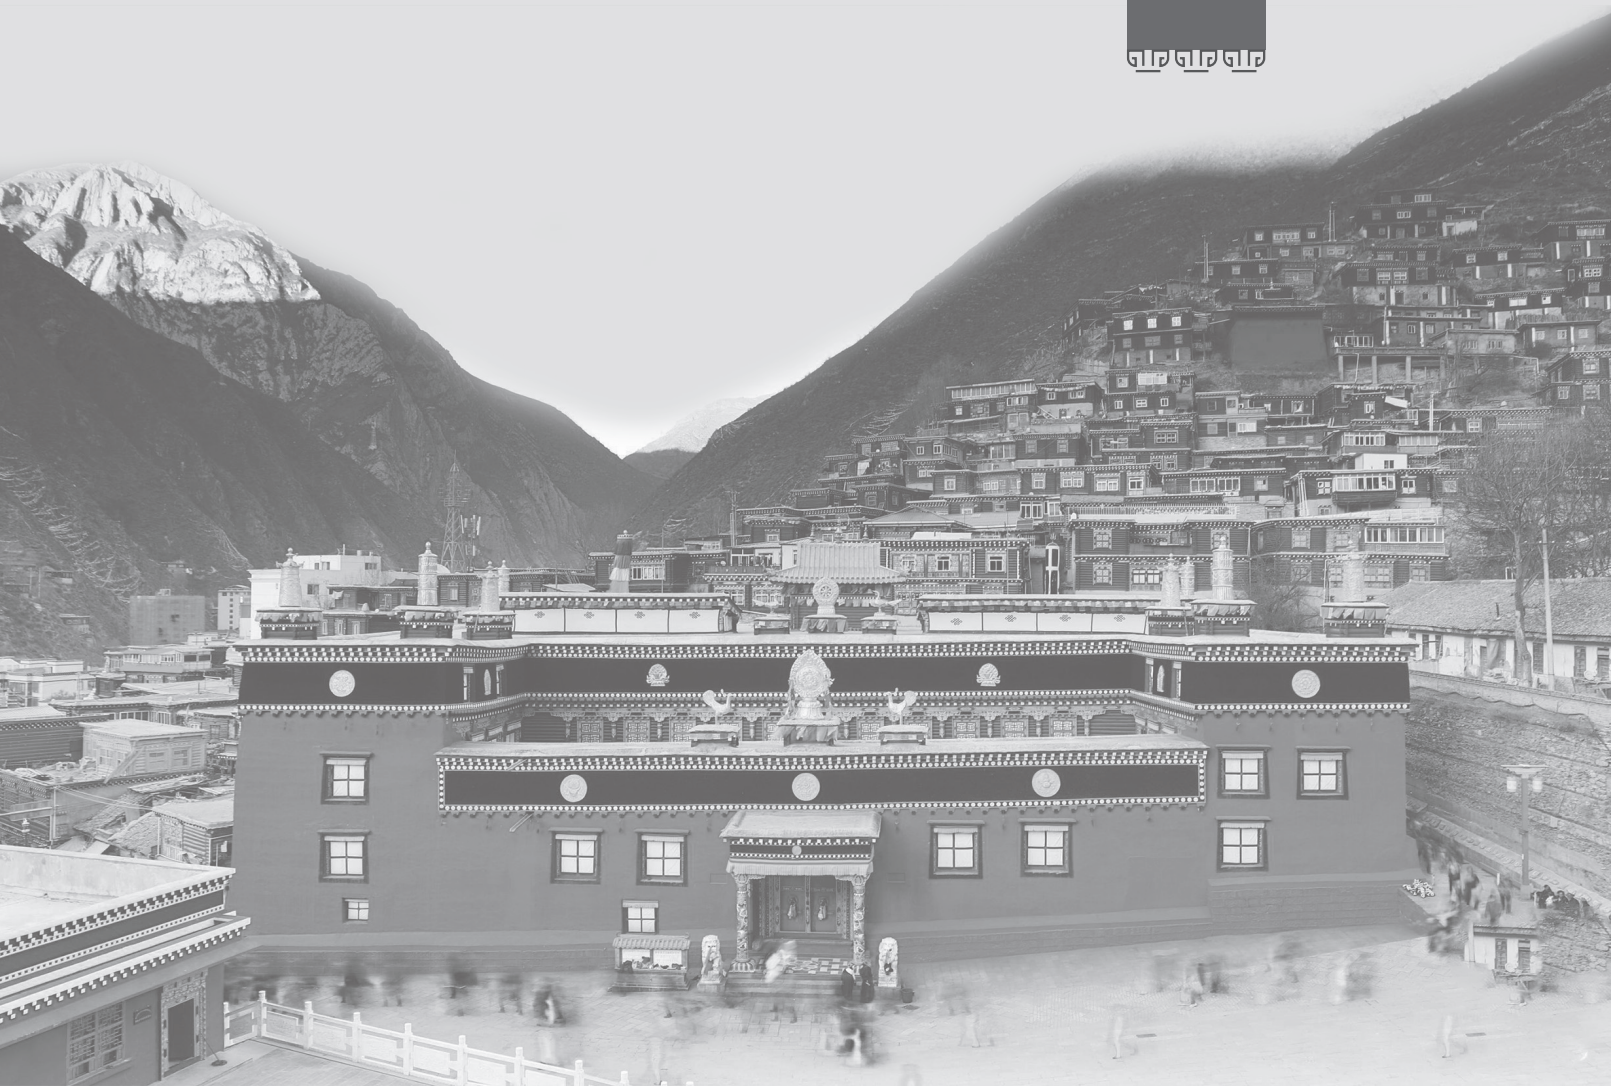

住房和城乡建设

【概况】 按照机构改革后设置的编制数 31 名，县住房和城乡建设局 2020 年全员满编。内设行政股室 5 个，配备专业人员 17 名，事业站所 5 名。2020 年，有班子成员 6 名，其中局长 1 名，副局长 4 名（含援藏副局长 1 名），总工程师 1 名。内设办公室、建筑业管理股、住房保障股和房地产业股、城市建设与管理股、村镇建设股。

【质监管理】 2020 年，报监项目 39 个，其中新开工项目 16 个，续建项目 23 个，下发整改通知书 21 份，开展监理考评 4 次（每季度 2 次）。企业建立安全生产责任清单制 32 家，开展安全生产培训 6 次，开展安全生产风险辨识 6 家。开展双随机检查 9 人次，发现问题 3 个；开展燃气检查 5 次，监督燃气企业开展消防演练 1 次；开展汛期检查、防雷检查、特种设备检查、食品安全检查、特种作业人员检查共计 19 次。

【城乡建设】 2020 年，城乡提升战略目标任务共计 11 项，明确 4 个项目实施主体责任单位。2020 年，全县有城乡提升建设项目 4 项：德格县色曲河防洪治理工程，计划投资 16311 万元，项目于 3 月复工建设，9 月主体完工，至年底，工程已建设完工。德格县城市夜景建设项目，计划总投资 7648.63 万，项目于 3 月底复工，9 月已完成桥梁，河道灯布设，至年底，工程已完工。德格县县城拓展区市政道路及附属工程建设项目，计划总投资 7521.04 万元，项目于 3 月底复工，9 月已完成路基、供排水管道铺设，至年底，已完成主体建设。德格县白格堰塞湖灾后重建堤防工程项目，计划总投资

1637.24 万元，项目于 3 月复工建设，9 月主体完工，至年底，已完成工程量的 82%，完成投资 1290.68 万元，完成年度计划 129%。全县共 4 个乡镇，7 个项目。德格马尼干戈镇污水处理配套设施项目，计划总投资 5036.8 万元，项目于 4 月底复工，9 月完成 45% 的管网铺设。至年底，已完成 100% 额管网铺设，完成 75% 的污水处理厂基础工程，完成投资 1450 万元，完成年度计划 145%。德格县乡镇生活垃圾卫生填埋场，项目计划总投资 1925 万元。项目于 4 月底复工建设，至年底，已完成主体工程，完成投资 210 万元，完成年度计划的 105%。阿须供水工程，计划总投资 3022 万元，项目于 4 月复工建设，9 月主体完工，至年底，已完工。德格县温拖水利工程（由县水利局主要负责），计划总投资 13438 万，项目于 3 月复工建设，9 月主体完工，至年底，已完工。德格县马尼干戈镇第二水厂建设工程（由县自来水公司主要负责），计划总投资 2496.03 万元，项目于 4 月复工建设，9 月主管道已经铺设完成，正在进行取水口及厂房建设。德格县马尼干戈镇供排水二期工程（由县自来水公司主要负责），计划总投资 2995 万元，项目于 4 月复工建设，9 月主体完工，至年底，已完工。德格县达马镇中心小学迁建项目（由县教体局主要负责），计划总投资 4195 万元，项目于 4 月复工建设；9 月主体完工，至年底，主体已完工。德格县城市夜景建设项目，计划总投资 7648.63 万元，建设内容包括对德格县及文都片区城市夜景照明打造共计 39 处共设置灯具 64580 套（组）及其他配套设施。年内，已拨付 1605.3 万元。完成格萨尔大街、巴宫街、藏医街、步行街、3 个特色藏餐厅、河道水系灯亮化、桥梁亮化以及文都片区管线安装，至年底，已竣工。德格县沿河市政工程项目污水管网重建工程建设项目，计划总投资 1612.24 万元，建设内容包
